

## Lote 4 - Rota: Contorno




**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av.Contorno, s/nº           | 50                   | D |
| Data do Registro: 05/11/2019 10:03:24 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 10025900285            |                      |   |


| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas       | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim             | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Concreto        | 10   |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Muitos          | 0    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Péssimo         | 0    |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Severo          | 0    |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não             | 10   |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não             | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim             | 10   |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não             | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não             | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não             | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não             | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não             | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não             | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ruim            | 0    |

Observações: Não foi possível identificar a numeração.

### Localização da Testada

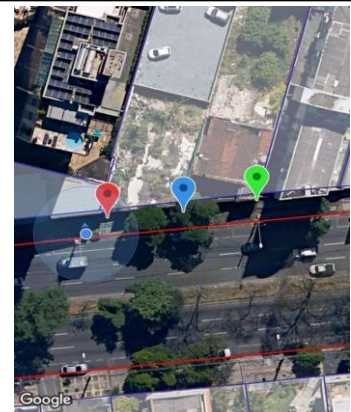

### Foto Geral

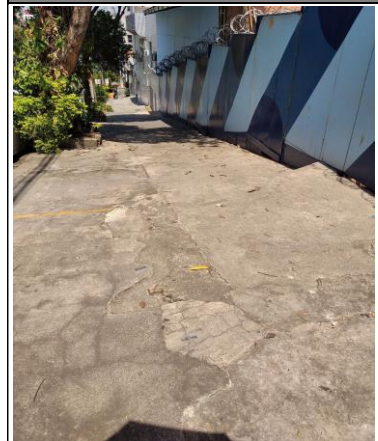

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



## Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                                                  | Qualidade do Serviço |          | Complemento do Diagnóstico |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| <b>Endereço:</b> Av.Contorno, s/nº<br><b>Data do Registro:</b> 05/11/2019 10:03:24<br><b>Num. Lote CTM:</b> 10025900285 | <b>50</b>            | <b>D</b> |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                               | Respostas | Nota |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| P_7_1   | Qual tipo do Rebaixo ?                                                        | -         | 0    |
| P_7_1_1 | Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?                     | -         | 0    |
| P_7_1_2 | Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?                       | -         | 0    |
| P_7_2   | A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?                          | -         | 0    |
| P_7_3   | O rebaixo possui piso tátil ?                                                 | -         | 0    |
| P_7_3_1 | O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?        | -         | 0    |
| P_8_1   | O piso tátil está no eixo da faixa livre ?                                    | -         | 0    |
| P_8_2   | Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?                    | -         | 0    |
| P_8_3   | Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?             | -         | 0    |
| P_8_4   | Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?  | -         | 0    |
| P_8_5   | Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma? | -         | 0    |
| P_8_6   | Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?                          | -         | 0    |
| P_8_7   | O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?                               | -         | 0    |
| P_8_8   | O piso tátil está em boas condições aparentes?                                | -         | 0    |
| P_8_9   | O piso tátil apresenta desenho com bom senso?                                 | -         | 0    |
| P_13_1  | Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?          | -         | 0    |
| P_13_2  | Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminhar seguro de pedestre?       | -         | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio
