

# Lote 3 - Rota: Antônio Carlos II



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av. Portugal, 921           | 55                   | C |
| Data do Registro: 19/11/2019 13:46:08 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 200063600770           |                      |   |

| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas             | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim                   | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Entre 1.20 m e 1.50 m | 6    |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Concreto              | 10   |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Poucos                | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Regular               | 5    |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Nenhum                | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim                   | 4    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não                   | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não                   | 0    |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não                   | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não                   | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não                   | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não                   | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Sim                   | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Regular               | 5    |

Observações:

Localização da Testada


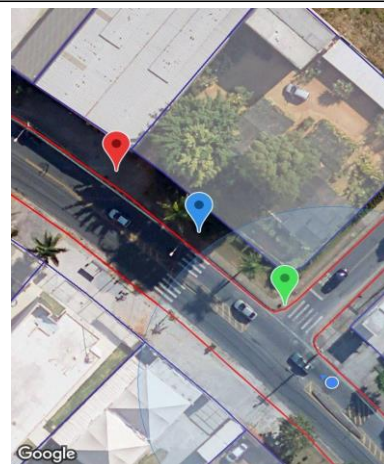


Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





## Lote 3 - Rota: Antônio Carlos II



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                              | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av. Portugal, 921<br>Data do Registro: 19/11/2019 13:46:08<br>Num. Lote CTM: 200063600770 | 55                   | C |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                               | Respostas                 | Nota |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| P_7_1   | Qual tipo do Rebaixo ?                                                        | Rebaixo Tipo 1 (trapézio) | 0    |
| P_7_1_1 | Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?                     | Não                       | -3   |
| P_7_1_2 | Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?                       | Não                       | -1   |
| P_7_2   | A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?                          | Sim                       | 0    |
| P_7_3   | O rebaixo possui piso tátil ?                                                 | Tem só piso de alerta     | -1   |
| P_7_3_1 | O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?        | Não                       | -1   |
| P_8_1   | O piso tátil está no eixo da faixa livre ?                                    | 0                         | 0    |
| P_8_2   | Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?                    | 0                         | 0    |
| P_8_3   | Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?             | 0                         | 0    |
| P_8_4   | Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?  | 0                         | 0    |
| P_8_5   | Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma? | 0                         | 0    |
| P_8_6   | Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?                          | 0                         | 0    |
| P_8_7   | O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?                               | 0                         | 0    |
| P_8_8   | O piso tátil está em boas condições aparentes?                                | 0                         | 0    |
| P_8_9   | O piso tátil apresenta desenho com bom senso?                                 | 0                         | 0    |
| P_13_1  | Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?          | 0                         | 0    |
| P_13_2  | Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminamento seguro de pedestre?    | 0                         | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

